
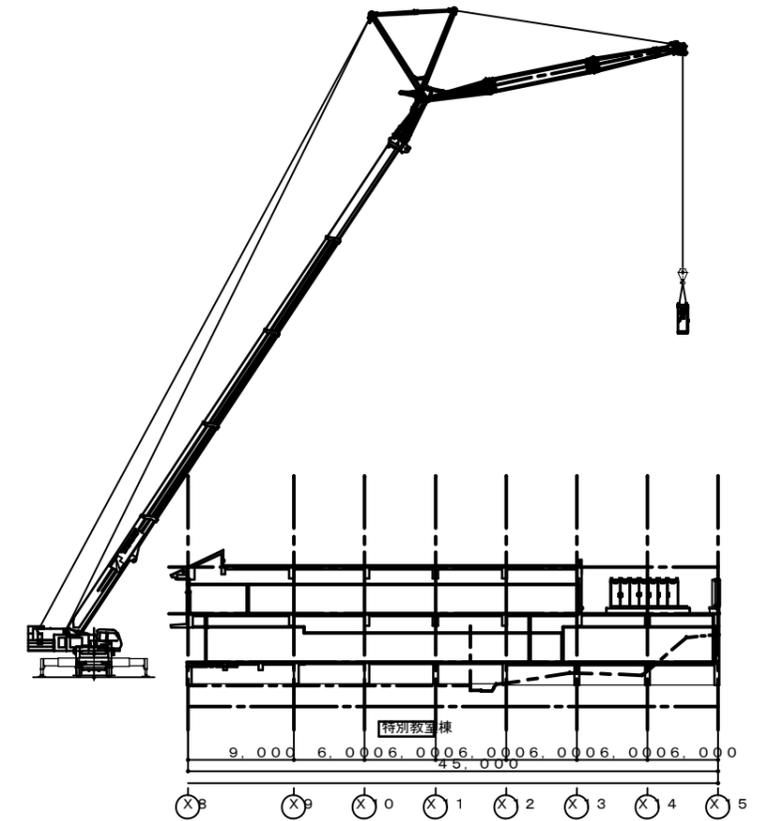


※ ②③搬入状態

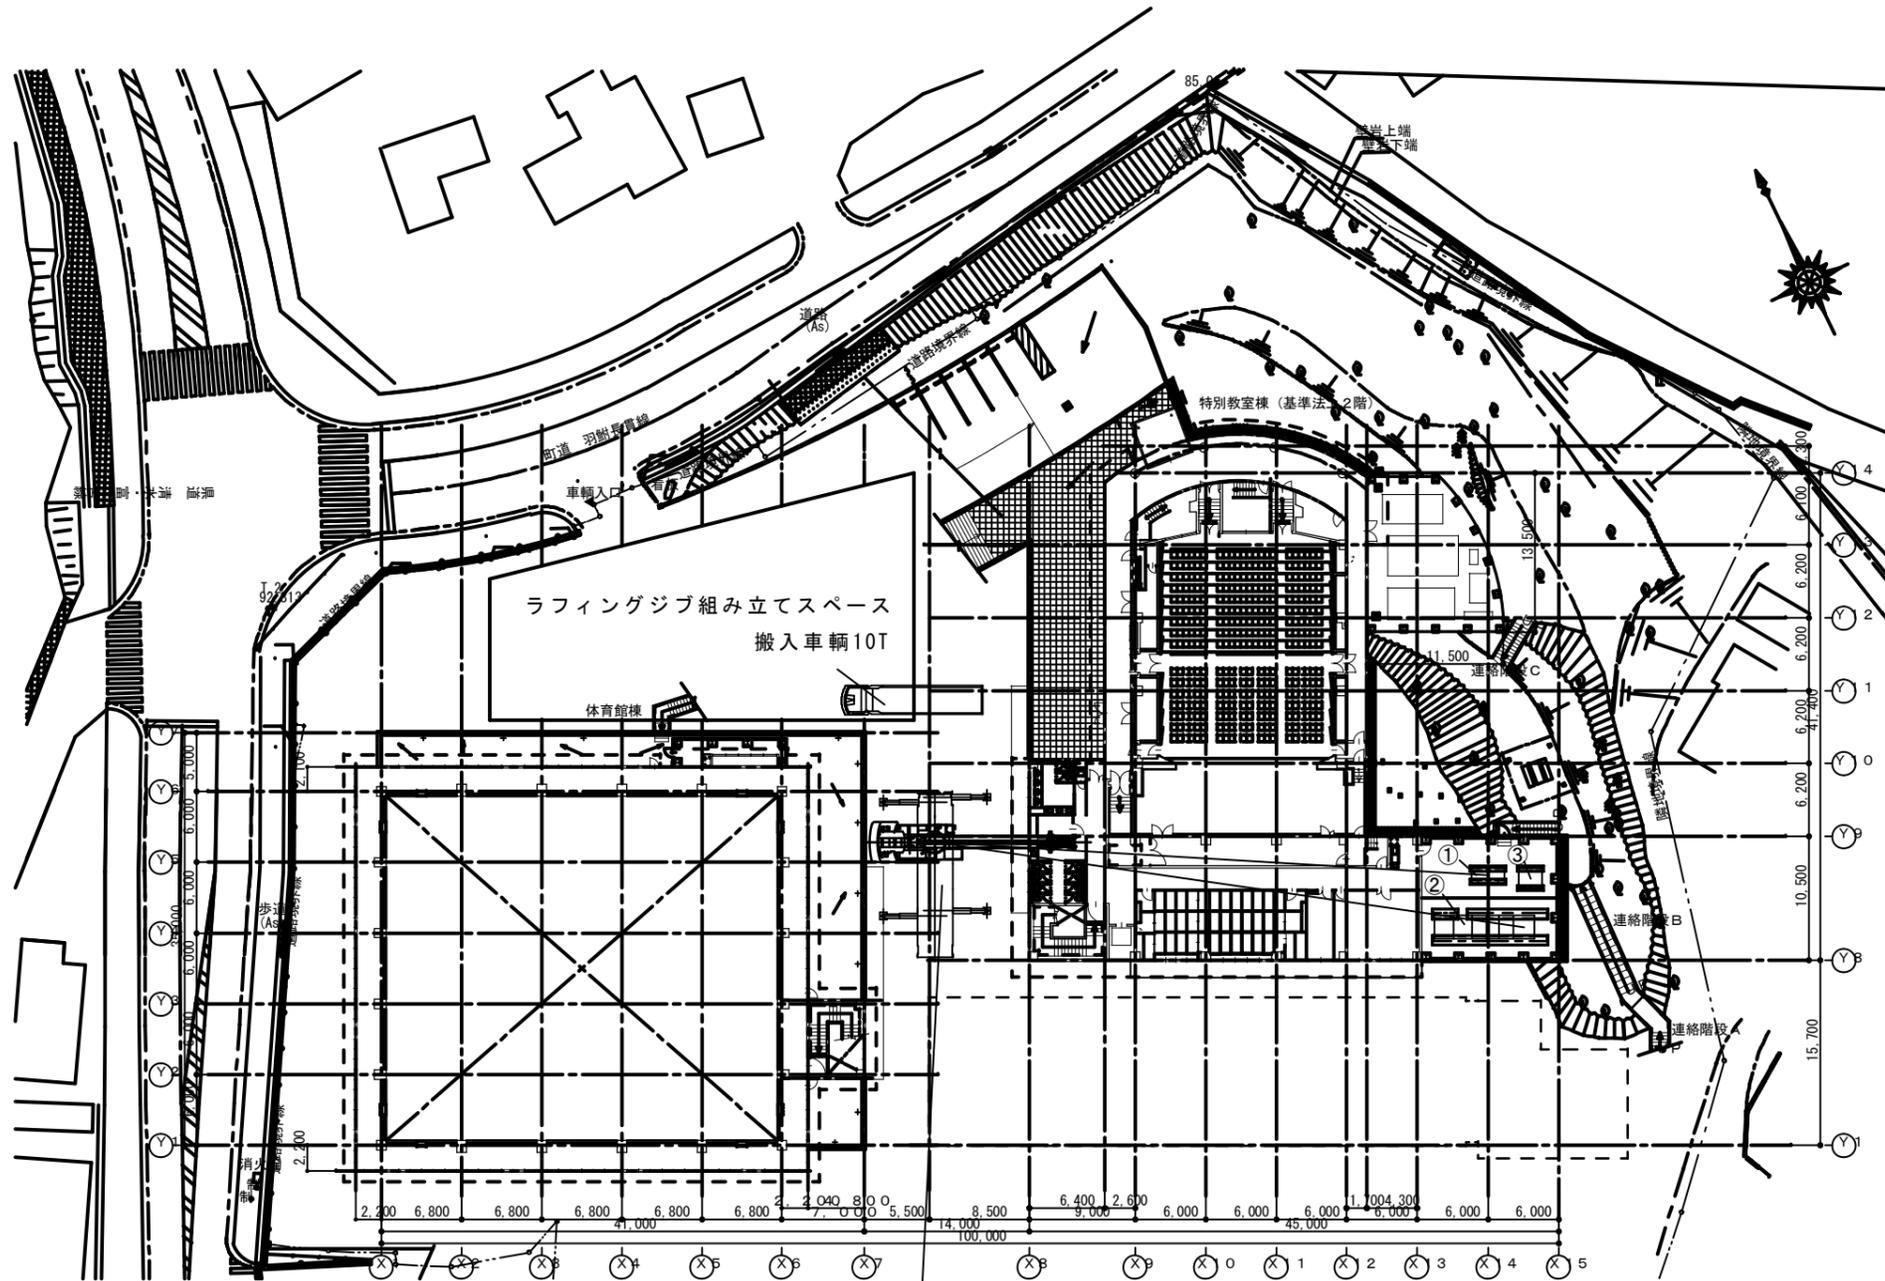

① 発電機 3530KG 作業半径47M

1. レッカー搬入仕様  
 TADANO AR-200M LA性能 4.5M+20Mラフィングジブ  
 メイン45.5Mブーム オフセット45° 作業半径48M 定格荷重4400KG  
 アウトリガー最大張出し (8.8m)  
 搬入最大許容荷重>搬入物最大重量  
 約3530KG>4400KG  
 安全に作業ができる範囲である。

②③ QP 最大1615KG オイルサービスタンク

1. レッカー搬入仕様  
 TADANO AR-200M LA性能 4.5M+20Mラフィングジブ  
 メイン50.1Mブーム オフセット45° 作業半径50M 定格荷重2800KG  
 アウトリガー最大張出し (8.8m)  
 搬入最大許容荷重>搬入物最大重量  
 1615KG>2800KG  
 安全に作業ができる範囲である。

レッカー200TR

秀盛機工(株) 浜松支店

記事  
 1  
 2  
 3

工事名称 \*\*\*\*複合的文教施設建設工事  
 図面名称 電気設備搬入計画図

作成 Y. OGAWA 図面番号 SYZ12870-1  
 縮尺 1/600 日付 05/062/25
